

KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- Uşak-Sivaslı (Denizli-Çardak) Ayr Projesi(38 km)



Projenin Yeri	Uşak / Sivaslı
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2010-2020
Proje Tutarı	206.241.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	8.335.000 TL.
Yıl Ödeneği	411.000
Fiziki Gerçekleşme	%5
Proje Hakkında Bilgi :	Toplam uzunluğu 118 km olan yolun 2016 yılı sonu itibarı ile 103,4 km'si BY (41,6 km BSK, 61,8 SK) olarak tamamlanmıştır. UŞAK ilindeki toplam proje uzunluğu 38 km olan projede 2016 yılı sonu itibarı ile 34,4 km BY-SK yol yapımı işi tamamlanmıştır. Uşak-Sivaslı-(Denizli-Çardak)Ayr. Yolu Km 0+000-56+416 Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK işlerinin ihalesi 12.01.2017 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin 2020 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

2- Uşak Çevre Yolu Projesi(30 Km)



Projenin Yeri	Uşak
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Tutarı	155.958.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	12.977.000 TL.
Yıl Ödeneği	18.000.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%9
Proje Hakkında Bilgi :	Toplam uzunluğu 30 km olan yol ihale edilerek Ağustos 2012 de işe başlanmıştır. 17 km.lik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve köprülül kavşakta çalışılmaktadır. Kusura 1 ve Kusura 2 Köprülerinde, Tarihi Çanlı Köprüsü koruma yapısında çalışmalar tamamlanmıştır. Eşme köprüsü tamamlanmış olup yaklaşım dolgularında çalışılmaktadır. Sivaslı Yolu F.S.K. Köprü yapımı tamamlanmış olup yaklaşım dolgularının toprakarme proje çalışması devam etmektedir. Proje tamamlandıktan sonra bağlantı yollarında çalışmalara başlanılacaktır. 2017 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapıda çalışılacaktır.

3- Ulubey - Güney Projesi(38 km)



Projenin Yeri	Uşak / Ulubey
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2004-2018
Proje Tutarı	17.351.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	2.906.000 TL.
Yıl Ödeneği	144.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%22
Proje Hakkında Bilgi : 38 km uzunluğundaki yolun 29 km.si Uşak İli sınırları içindedir. Proje, TY-SK olarak yapılması işinin 25.02.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.2017 yılında toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına devam edilmektedir. Müteahhitten kaynaklanan problemlerden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.	

4- Uşak - Ulubey Projesi(32 km)



Projenin Yeri	Uşak / Ulubey
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Tutarı	24.434.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	15.381.000 TL.
Yıl Ödeneği	-
Fiziki Gerçekleşme	%63
Proje Hakkında Bilgi : Toplam uzunluğu 32 km olan yolun 2016 yılı sonu itibarı ile 12 km.lik kesimi BY(3,6 BSK, 8,4 SK) , 20 km.lik kesimi TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında BY standardındaki 2 Km.lik kesimin SK üzeri BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 2,5 km SK üzeri BSK olarak tamamlanmıştır. Bölme'deki DDY. Üstgeçit Köprüsü bitirilmiş olup, BSK (üstyapı çalışmaları nedeniyle) trafik sol şeritten 2 yönlü olarak çalışmaktadır.	

5- Ulubey - Eşme Projesi(27 km)



Projenin Yeri	Ulubey / Eşme
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Tutarı	18.912.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	7.158.000 TL.
Yıl Ödeneği	1.000.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%41
Proje Hakkında Bilgi : Toplam uzunluğu 27 km olan yolun 2016 yılı sonu itibarı ile 14 km.lik kesimi TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 7,7 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.	

6- Kula - Eşme Projesi (19+4,4 Km)




Projenin Yeri	Uşak / Eşme
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Tutarı	14.967.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	17.000 TL.
Yıl Ödeneği	1.508.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%19
Proje Hakkında Bilgi : Toplam uzunluğu 41,4 km olan yolun, 2016 yılı sonu itibarı ile 28,4 km.si TY –SK olarak tamamlanmıştır.Projenin Uşak ili sınırları içerisinde kalan 23,4 km.lik kesiminin ise 12,4 km.si TY- SK olarak tamamlanmıştır. Mevcut ihale fesih edilmiş olup, Kula-Eşme Yolu, Eşme Çevre Yolu ve Alaşehir Bağlantı Yolunun yapım işleri 06.09.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanarak işyeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.2017 yılında 3 Km.lik kesimin TY- SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.	

7- (Uşak-Kula)Ayr.-14. Bl Hd. Yolu (19 Km)



Projenin Yeri	Uşak
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2011-2019
Proje Tutarı	73.550.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	14.000 TL.
Yıl Ödeneği	1.479.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%2
Proje Hakkında Bilgi : Toplam uzunluğu 19 km olan (Kula-Uşak)Ayr.-14. Bölge Hududu yolunun 16.05.2016 tarihinde BY-BSK olarak ihale edilmiş olup, 20.03.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.	

8- Eşme-Güney Ayr. Yolu (32 Km)

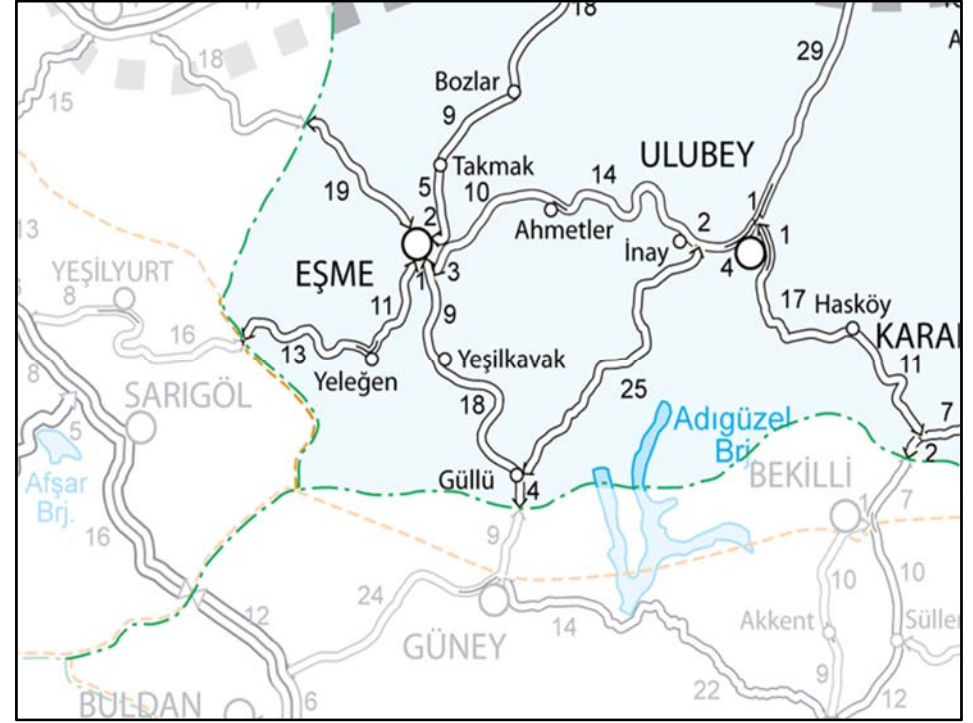


Projenin Yeri	Uşak / Eşme
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Tutarı	17.581.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	9.000 TL.
Yıl Ödeneği	2.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%-
Proje Hakkında Bilgi : 28 Km uzunluğundaki yolun proje çalışmaları tamamlanmış olup, Genel Müdürlükte onay aşamasındadır.	

9- (Sivaslı-Çivril) Ayr.-Karahallı-Bekilli Yolu (31 Km)




Projenin Yeri	Uşak / Sivaslı
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Tutarı	10.340.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	8.000 TL.
Yıl Ödeneği	-
Fiziki Gerçekleşme	% -
Proje Hakkında Bilgi : 38 Km uzunluğundaki yol proje programına teklif edilmiştir. Alınması durumunda projesi hazırlanacaktır.	

10- Banaz-Hocalar Yolu(23 Km)

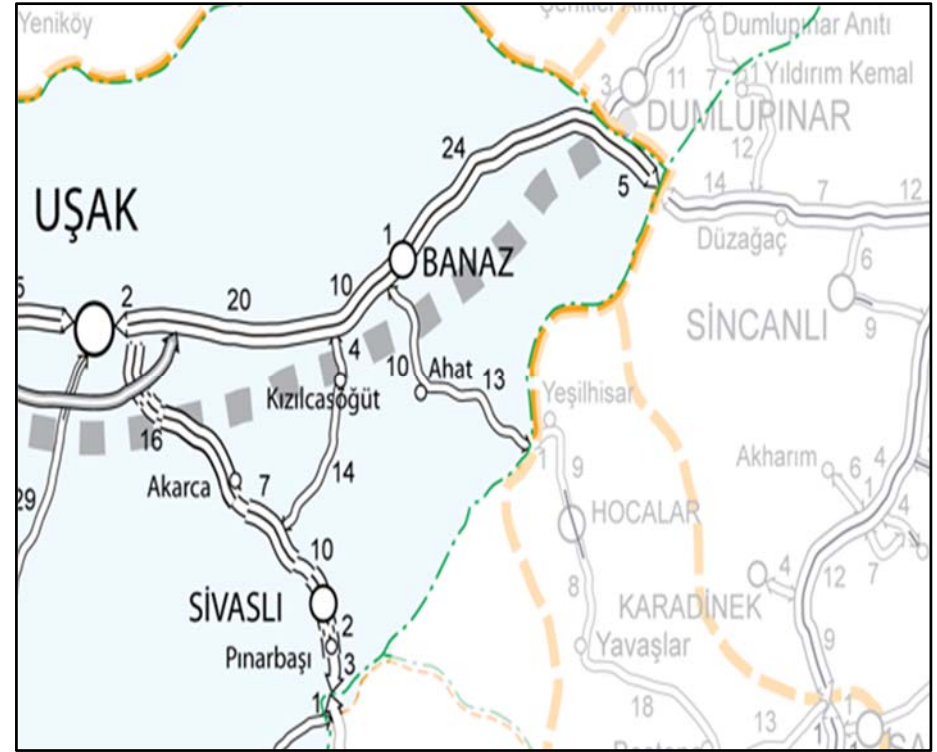


Projenin Yeri	Uşak / Banaz
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Tutarı	18.669.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	6.000 TL.
Yıl Ödeneği	2.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%0
Proje Hakkında Bilgi : Bölge Müdürlüğümüz hudutlarındaki uzunluğu 23 km olan yolda 2017 yılında bugüne kadar bakım onarım çalışması yapılmıştır.	

11- (Eşme-Ulubey)Ayr.-Güllü Yolunda; Aksaz, Güllü Köprüleri

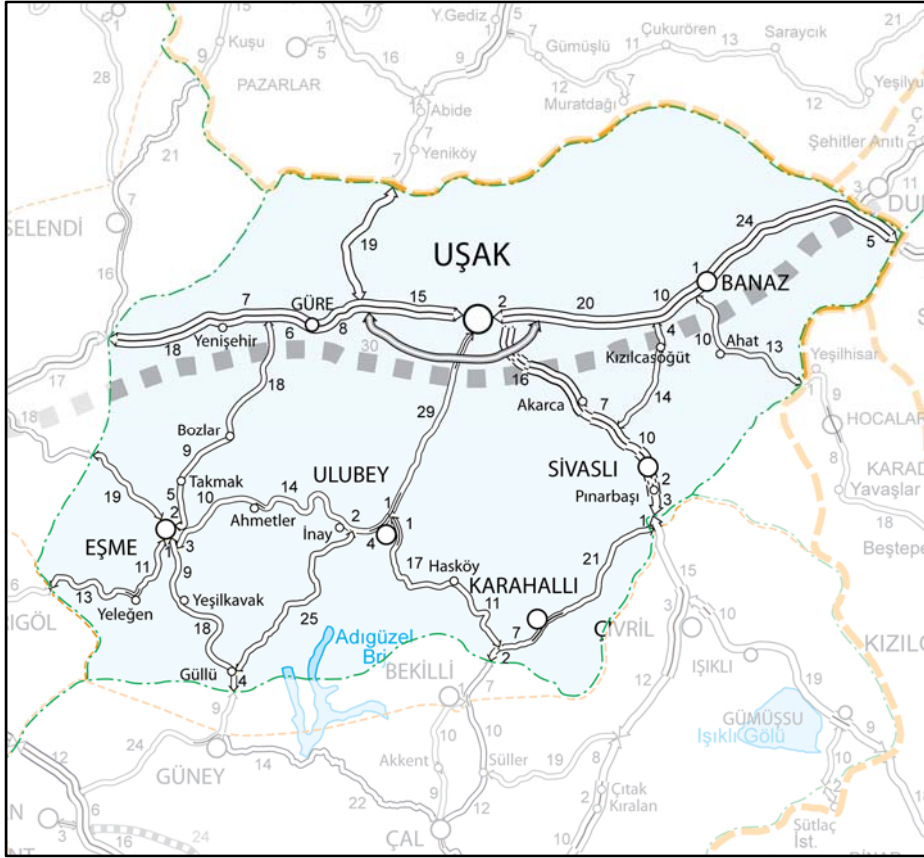


Projenin Yeri	Eşme / Ulubey
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2019
Proje Tutarı	5.100.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	547. 000 TL.
Yıl Ödeneği	3.000.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	% 11
Proje Hakkında Bilgi : Aksaz (60 m), Güllü (100 m) köprülerinin projeleri hazırlanmış olup, 2017 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.	

12- (Uşak- Afyon)Ayr.- Uşak- Çivril- Denizli Yolu (CANLI, KIRKA, BANAZ)

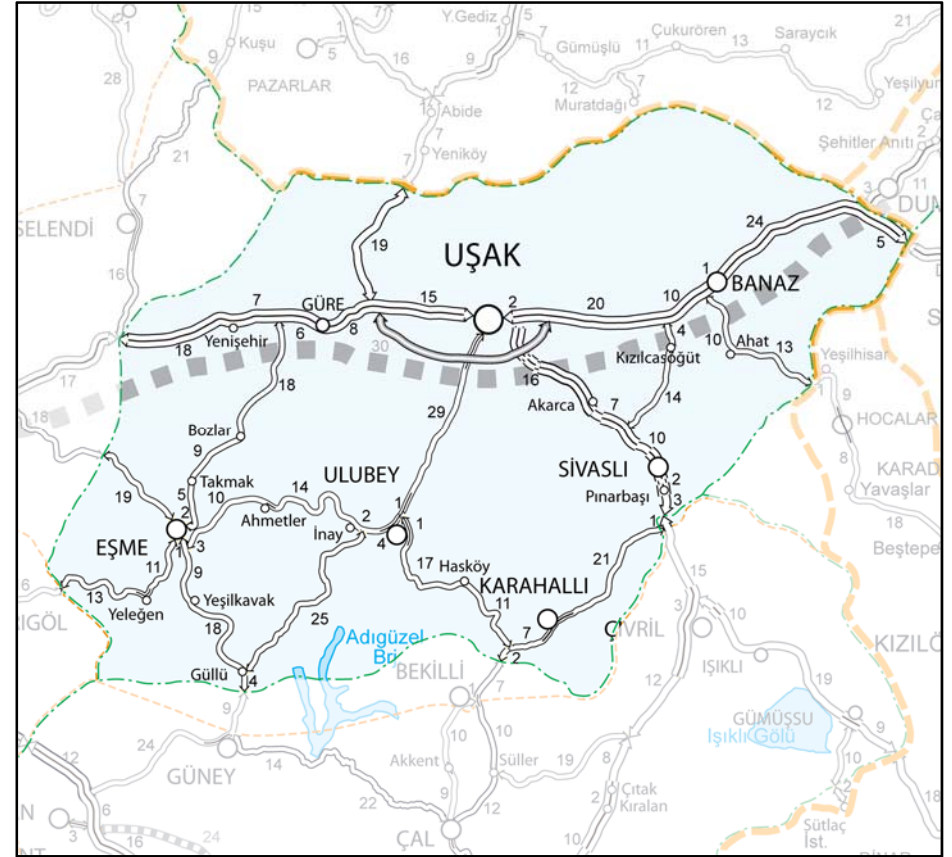


Projenin Yeri	Uşak
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Tutarı	1.800.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	-
Yıl Ödeneği	6.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	% -
Proje Hakkında Bilgi : 2017 yılında Yatırım Programına alınmıştır. 2017 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.	

13- TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI – (Yenişehir, Hamam):

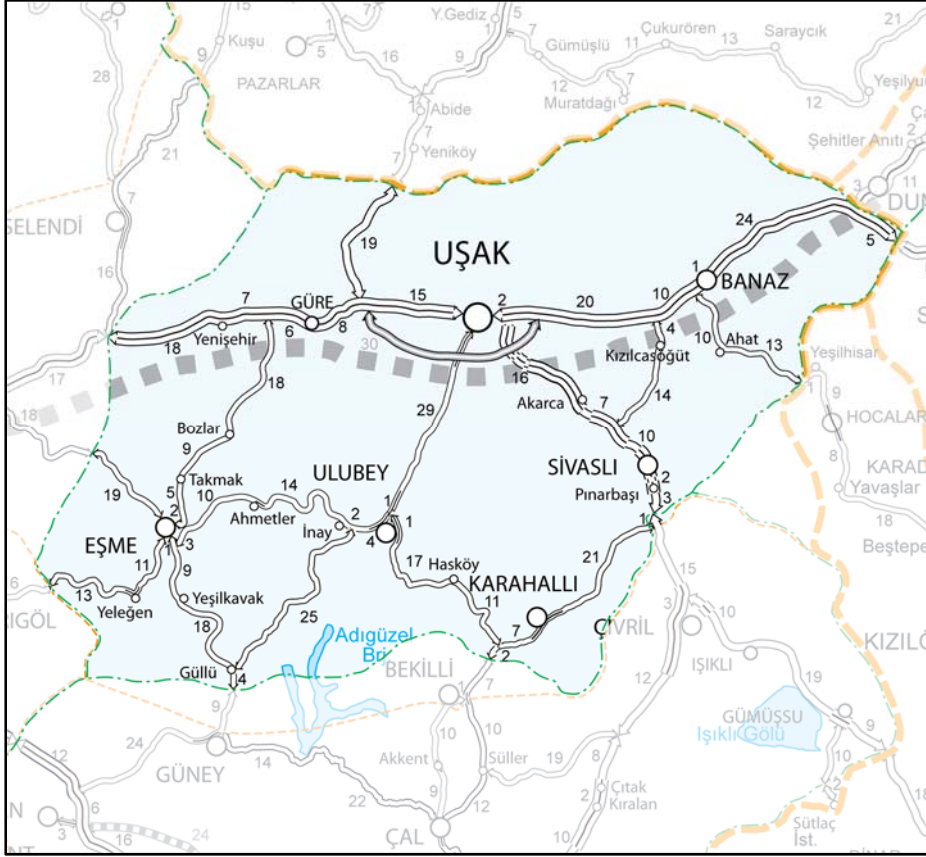

Projenin Yeri	Uşak
Sektörü	Ulaştırma
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Tutarı	700.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	-
Yıl Ödeneği	70.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	-
Proje Hakkında Bilgi :	Uşak ili Merkez ilçesinde YENİŞEHİR (Çataltepe) Ulubey ilçesinde HAMAM (Hasköy) Köprülerinin sağlanacak ödenekler doğrultusunda 2017 yılı içinde bakım onarım ihalesi yapılacaktır.

İZMİR-ANKARA OTOYOLU :

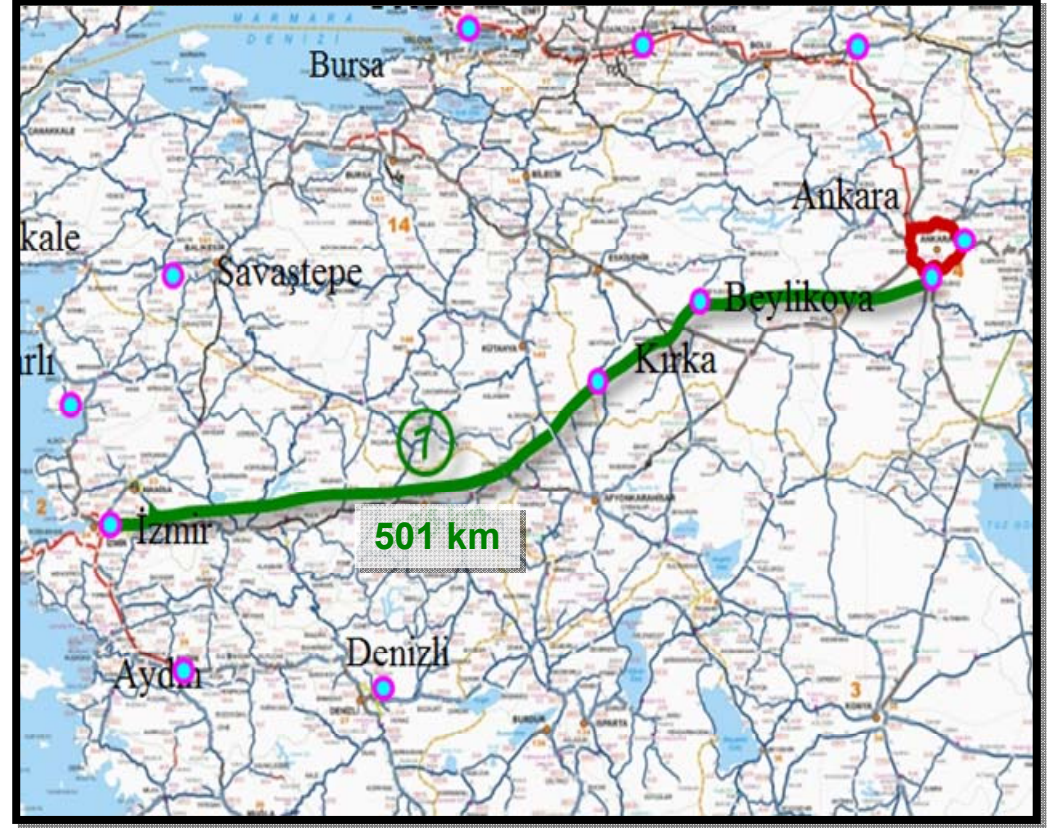

501 km otoyol ve 72 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 573 km.dir. Yolun 225 km. si Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer almaktadır (113 Km Uşak, 112 Km Manisa).

1/5.000'lik plan-profil paftaları onaylanmıştır. Zemin araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Proje çalışmalarının 2017 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.

